



- ・7月13日7時～7月14日14時にかけて、前線による影響で雨が降った。
- ・7月13日7時の降り始めから7月14日14時までの総雨量は、流域平均63.6mmであった。
- ・降り始めから約25.6時間後の14日8時40分に事前放流開始流入量の330m³/sを上回り、9時01分から事前放流を開始した。
- ・事前放流開始から約5.6時間後の14日14時39分、流入量は最大919.58m³/sを記録した。
- ・その後流入量は低下し、事前放流開始から約19.1時間後の15日4時10分、330m³/sを下回った。

 流入量 (m³/s)
  堰上流水位 (T.P.m)
  全放流量 (m³/s)

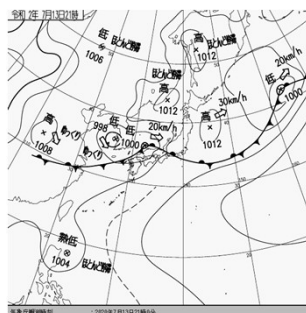

7月14日 6:00 雨量図

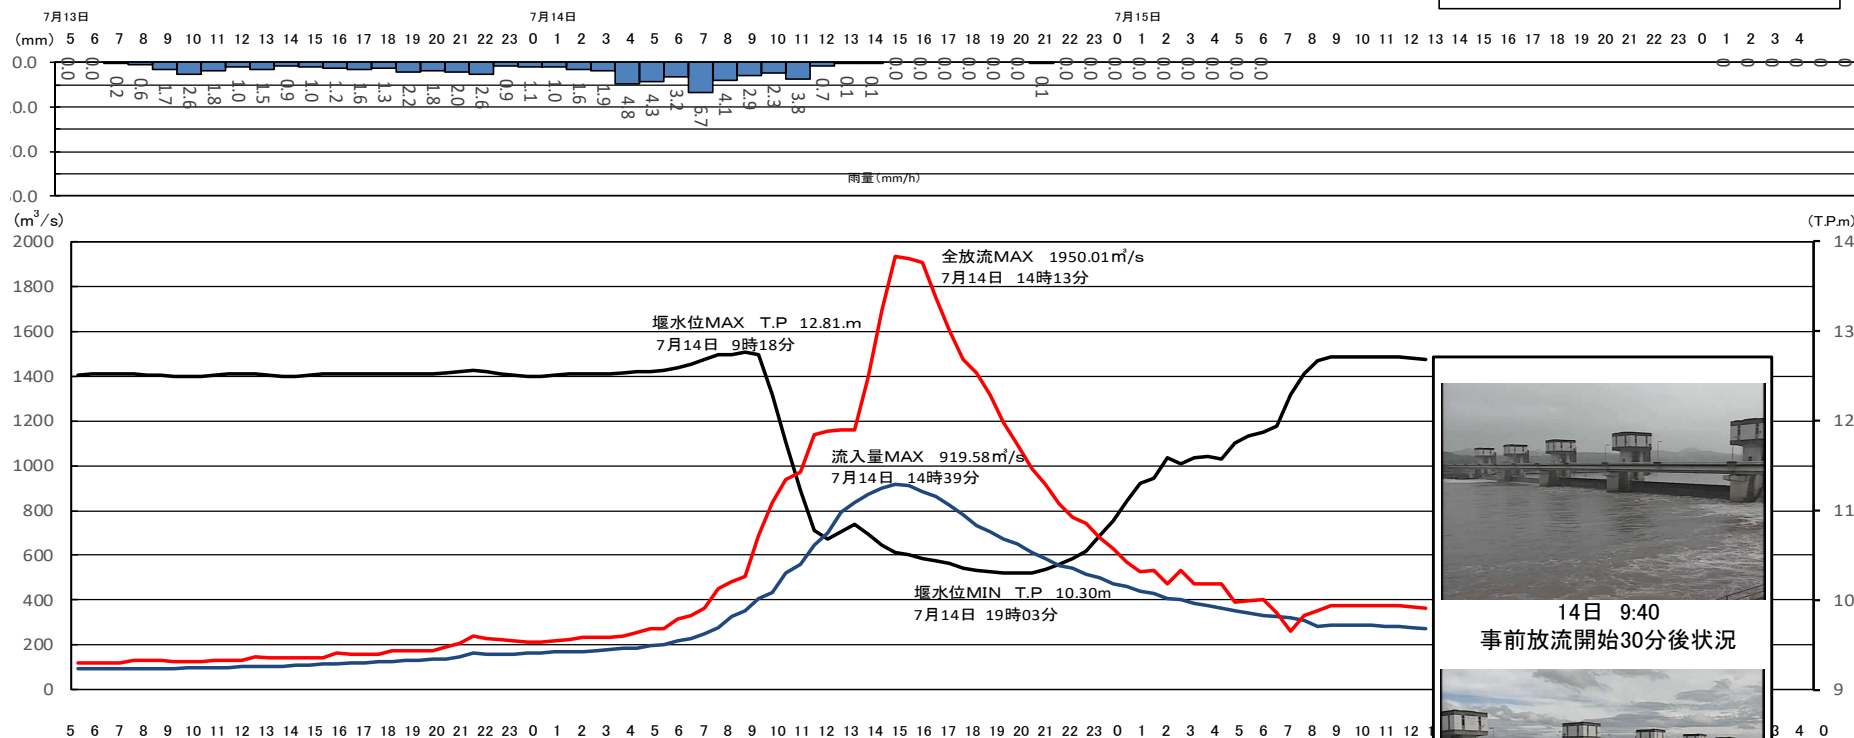

14日 9:40
事前放流開始30分後状況



14日 14:50
全流入量ピーク 状況

本体ゲート	9:01 事前放流制御	15:16 貯留回復Ⅱ制御	5:06 定水位Ⅰ（調節上段）制御
微調節ゲート			
魚道ゲート （左岸）	7:21-8:06 全開移行		7:12-7:49 越流水深移行
魚道ゲート （右岸）	7:21-7:58 全開移行		7:12-7:49 越流水深移行
通知	4:30 準備体制発令	6:10 洪水警戒体制発令	15:30 貯留回復体制更新
通報	予備警戒体制発令		5:10 洪水警戒体制解除
警報	8:30 ブロックタイマー放送	10:30 全局一斉	
パトロール	8:03-9:49 始 終		
その他			



14日 14:50

全流入量ピーク 状況
